

## ATIVIDADES OBRA BLOCO 02 - FEVEREIRO DE 2023

### 1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

**Construtora:** AMBONI CONSTRUÇÕES LTDA

**Contrato nº:** 17/2022

**Objeto:** Execução da segunda etapa do Edifício Multiúso da UNILA – Construção do Bloco de Aulas 2.

**Data de início da vigência do contrato:** 01/12/2022

**Data de término da vigência do contrato:** 24/04/2024

**Data da Ordem de Serviço:** 12/12/2022

**Prazo de execução:** 420 dias

**Término Previsto da Obra:** 05/02/2024

**Valor do Contrato:** R\$ 8.196.106,00 (oito milhões, cento e noventa e seis mil e cento e seis reais)

### 2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades executadas no período de **fevereiro** de 2023 na obra denominada Construção da Segunda Etapa do Edifício Multiúso da UNILA – Construção do Bloco de Aulas 02 foram:

#### QUADRO 01 – DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES EM EXECUÇÃO/EXECUTADAS

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	STATUS
Locação de Obra	Finalização dos serviços de locação de obra.	EXECUTADO
Vigas Baldrame	Conclusão dos serviços de baldrame no Bloco C.	EXECUTADO
Estrutura de Concreto	Execução dos pilares do Pavimento térreo, no Setor A, B e C.	EXECUTADO
Estrutura de Concreto	Execução das vigas e laje do Pavimento Superior no Setor A.	EXECUTADO

\*De acordo com a medição 03 - Referente a fev/2023


Fonte: Autoria própria

### 3 CRONOGRAMA DO AVANÇO DAS OBRAS

Na evolução do cronograma financeiro geral da obra, foram aferidos na terceira medição **R\$376.611,07** (trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e onze reais e sete centavos), correspondente a 4,60% do valor contratual. De acordo com o Cronograma físico-financeiro de Referência, o percentual previsto para a medição 03 era de 7,08%.


Ainda de acordo com o Cronograma de Referência, o acumulado até a 3ª Medição deveria ser de 15,89%. No entanto, encontra-se em 12,70%. Portanto o avanço financeiro da obra apresenta um atraso de 3,19%. Os gráficos 01 e 02 ilustram o avanço mensal e o avanço acumulado da obra.

**GRÁFICO 01 – AVANÇO FINANCEIRO MENSAL**

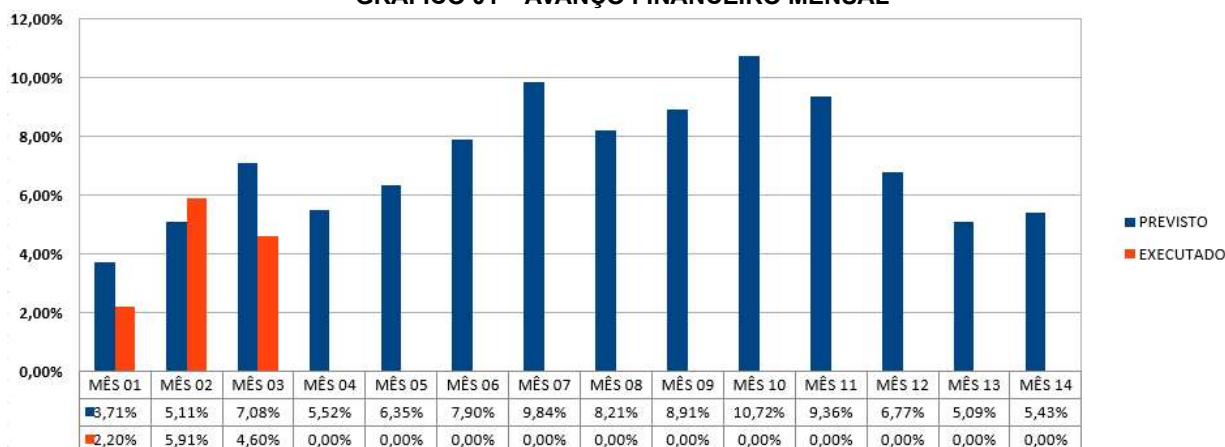

Fonte: Autoria própria

**GRÁFICO 02 – AVANÇO FINANCEIRO ACUMULADO**

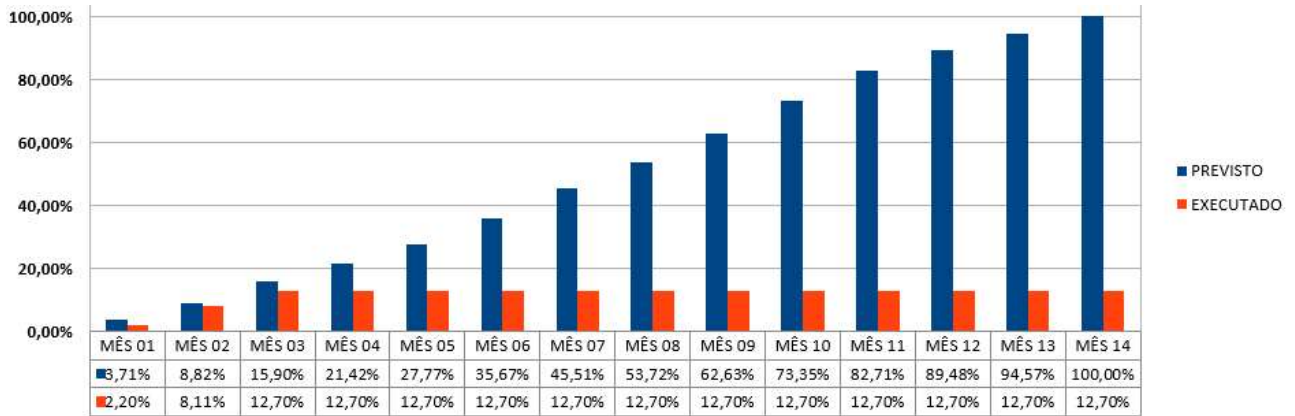

Fonte: Autoria própria

#### 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Figura 1 – Armação e formas de pilares Setor A**



**Figura 2 – Formas e armação de baldrames Setor C**



**Figura 3 – Concretagem pilares - Setor A**



**Figura 4 – Formas de Pilares**



**Figura 5 – Pilares Setor A**



**Figura 6 – Pilares – Setores A e B**



**Figura 7 – Reaterros após finalização de baldrames – Setor C**



**Figura 8 – Corpos de Prova**



**Figura 9 – Concregagem pilares – Setor B**



**Figura 10 – Armação pilares – Setor C**



**Figura 11 – Formas e armação de vigas e laje – Setor A**



**Figura 12 – Escoramento – Setor A**



**Figura 13 – Escoramento – Setor A**



**Figura 14 – Armação e forma de pilares – Setor C**



**Figura 15 – Cubetas laje – Setor A**



**Figura 16 – Concretagem laje e vigas – Setor A**
